




# Styringsdokument for fellesnemnda – Nye Drammen

Behandlet i fellesnemnda oktober 2018



## Innhold

Bakgrunn .....	3
Formål.....	3
Om dokumentet .....	3
Prosjektorganisering .....	4
Politiske prosjekter (P) .....	7
P1 Politisk organisering .....	7
P2 Identitet, symboler og felles kultur .....	9
P3 Regional posisjon.....	10
Administrative prosjekter med behov for politisk forankring (AP) .....	12
AP1 Forberedelse til arbeidet med ny kommuneplan .....	12
AP2 Strategier for tjenesteutvikling .....	13
AP3 Stedsutvikling .....	13
AP4 Arbeidsgiverpolitikk .....	15
AP5 Interkommunale samarbeid og eierskap .....	15
AP6 Økonomisk politikk og handlingsregler .....	16
AP7 Innovasjon og digitalisering .....	16
AP8 Kommunevalg 2019 .....	17
Administrative prosjekter (A) .....	18
A1 Administrativ organisering, ledelse og tjenesteutvikling .....	18
A2 Eiendom .....	19
A3 Kommunikasjon .....	19
A4 IKT, arkiv, matrikkel.....	20
A5 Anskaffelser .....	20

## Bakgrunn

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Svelvik og Drammen å søke om å etablere en ny kommune sammen. Nedre Eiker fattet et tilsvarende vedtak desember 2016.

Styringsdokumentet er utarbeidet for å sikre ivaretagelse av politiske og administrative oppgaver som må gjennomføres fram til den nye kommunen er etablert som eget rettssubjekt.

## Formål

Styringsdokumentet skal sikre nødvendige handlinger og fremdrift i planlegging og etablering av Nye Drammen, samt å fastsette retningslinjer for prosessarbeidet.

## Om dokumentet


Styringsdokumentet skal ivareta prosjektgjennomføringen. Noen prosjekter vil være et politisk ansvar, andre prosjekter vil være et administrativt ansvar, mens enkelte oppgaver har både politiske og administrative dimensjoner. Det vil derfor være hensiktsmessig å skille mellom:

- Politiske prosjekter (P)
- Administrative prosjekter med behov for politisk forankring (AP)
- Administrative prosjekter (A)

Alle prosjektene inneholder ulike oppgaver, mandat og fremdriftsplan.


Det vil bli rapportert på framdrift til fellesnemnda.

## Prosjektorganisering

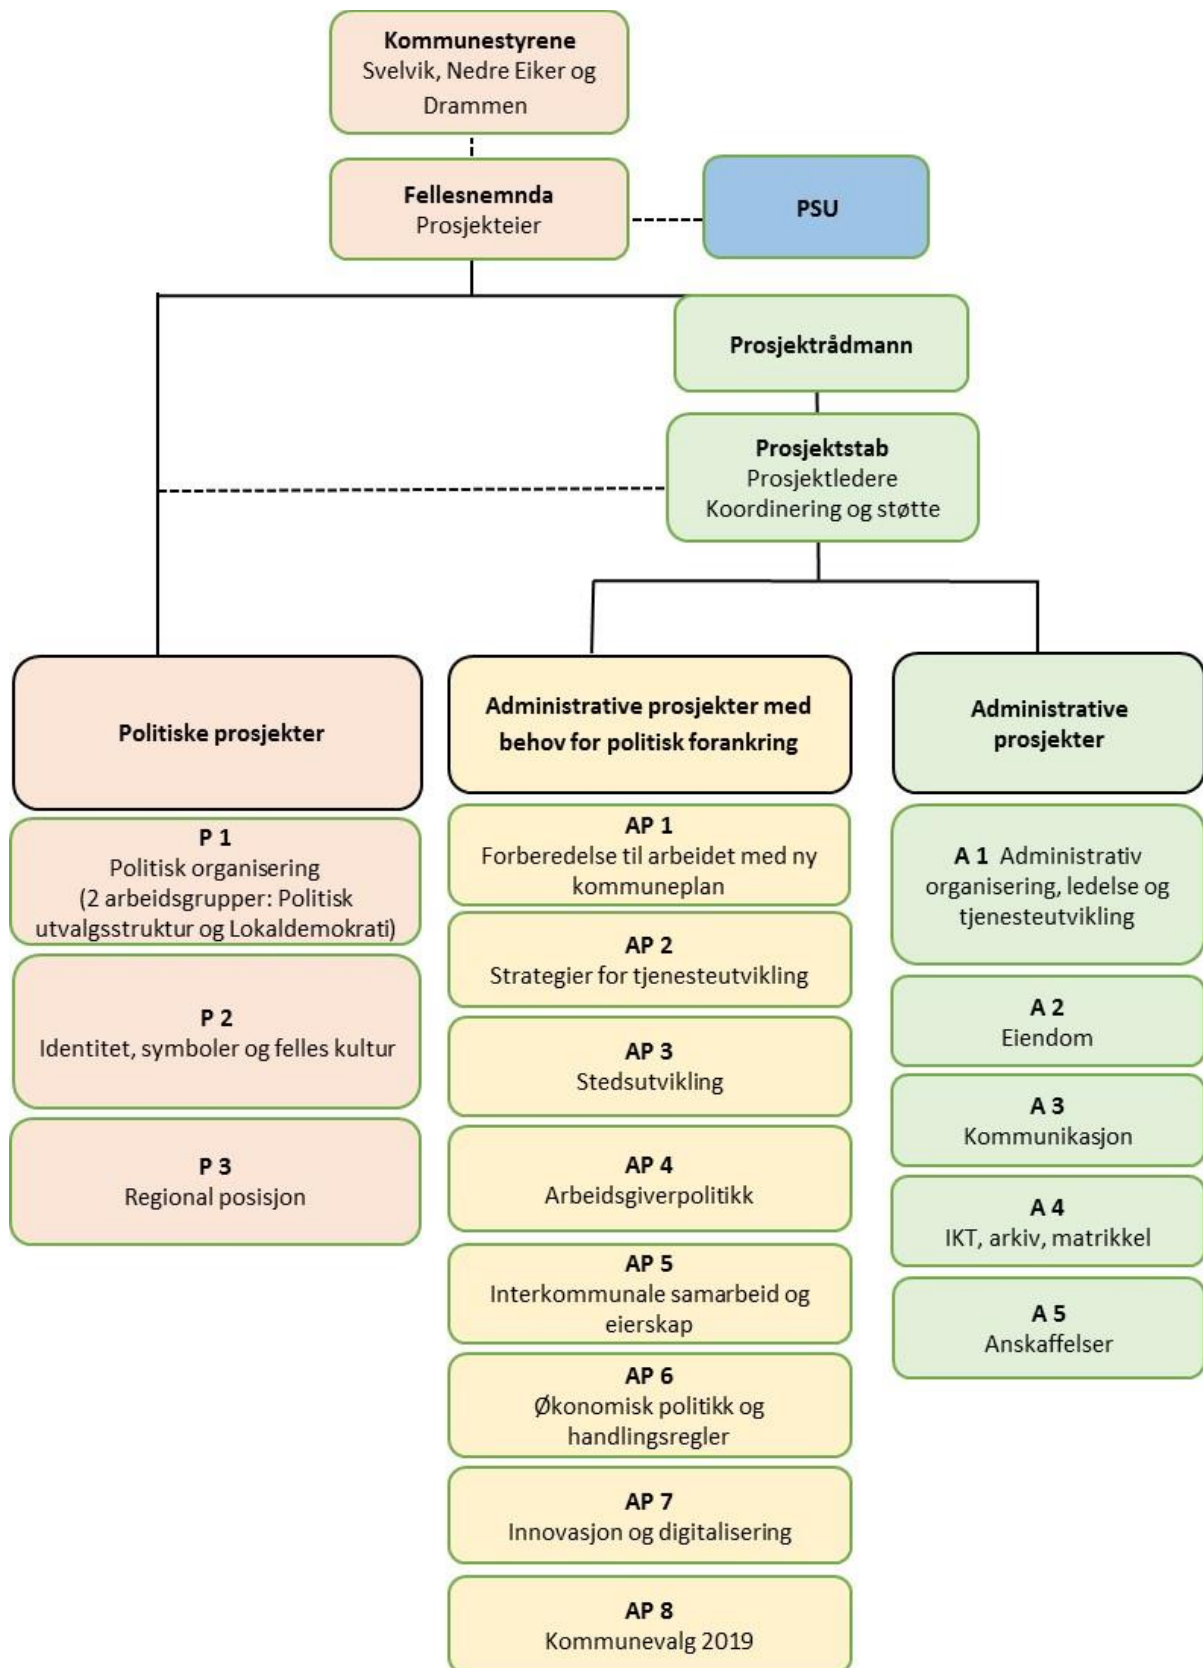


## Oversikt over arbeidsgrupper med politisk deltakelse:

### Politiske prosjekter



### Administrative prosjekter med politisk forankring

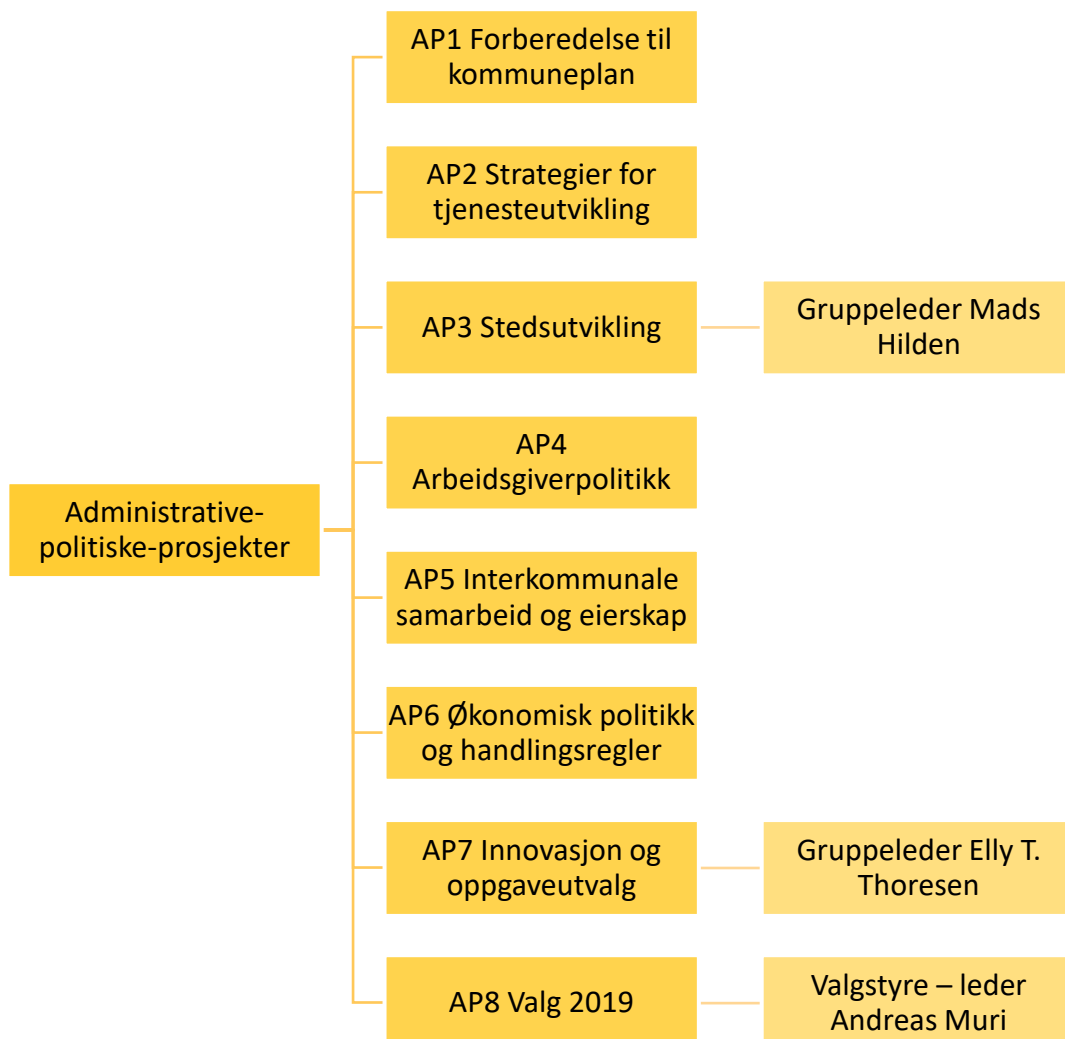

Tydlig ansvars- og rolleavklaring mellom politiske og administrative organer i gjennomføringen av sammenslåingsprosessen er avgjørende for hvordan prosessen oppleves, og hvilke resultater det er mulig å oppnå.

## Fellesnemnda

Prosjekteier er fellesnemnda. Fellesnemnda har det overordnede ansvaret for byggingen av Nye Drammen. Dette innebærer at de skal lede og styre hele prosessen, fatte nødvendige vedtak i henhold til inndelingslova, politisk plattform og reglement for fellesnemnda.

Forholdet mellom fellesnemnda og kommunestyrene: Alle vedtak som gjelder enkeltkommuner må fattes i kommunestyrene. Skal fellesnemnda fatte vedtak som angår en eller flere av enkeltkommunene, må det enkelte kommunestyre avgi fullmakt om delegert vedtaksmandat til fellesnemnda. Vedtak som angår den nye kommunen fattes av fellesnemnda.

## Partssammensatt utvalg (PSU)

I følge «Reglement for partssammensatt utvalg» har PSU ansvar for behandling av saker som gjelder forhold mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal være et drøftings- og konsultasjonsorgan for å sikre at beslutninger fattes på et så bredt grunnlag som mulig, og at flest mulige perspektiv er belyst. PSU fatter ikke vedtak.

## Prosjektrådmann

Prosjektrådmann vil være prosjektleder, og ha koordineringsansvar for sammenslåingsprosessen og de ulike prosjektene. Prosjektrådmann er ansvarlig for at prosjektene er effektivt organisert og bemannet. Fellesnemnda gir prosjektrådmannen fullmakt til å lage mandater til de administrative prosjektene og de administrative prosjektene med behov for politisk forankring.

Prosjektrådmannen sørger for at fellesnemnda holdes løpende orientert om status og framdrift.

Prosjektrådmannen har ansvar for at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for det overordnede prosjektet og for alle delprosjekter.

## Prosjektstab

Etter at prosjektrådmannen har nedsatt sin ledergruppe, vil ledergruppen støtte prosjektrådmannen i ivaretagelsen av prosjektledelsen og bli en del av prosjektstab. Prosjektstab ledes av prosjektrådmannen.

Prosjektstab kan blant annet ivareta følgende oppgaver i prosjektorganiseringen:

- Stille tilstrekkelig kartleggings- og utredningskompetanse til rådighet for fellesnemnda og arbeidsgruppene.
- Ivareta det løpende behovet for kommunikasjonsfaglig bistand i prosjektene.
- Bidra til koordinering og det praktiske rundt prosjektorganisasjonen, herunder metodebistand, fasilitering, prosjektteknisk støtte (IKT) og merkantil støtte.

## Politiske prosjekter (P)

- Politiske prosjekter igangsettes politisk, og er fellesnemndas ansvar.
- De politiske arbeidsgrupper rapporterer til fellesnemnda, og fellesnemndas leder innstiller

(§) = lovpålagt

(PP) = Politisk plattform

◆ = Politisk vedtak

◆ = Politisk prinsippavklaring

### P1 Politisk organisering

Prosjektet er delt i to delprosjekt:

1. Politisk utvalgsstruktur (P1.1-1.4)
2. Lokaldemokrati (P1.5)

Milepælsplan for P1:

P 1	POLITISK ORGANISERING	2017		2018				2019			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
P 1.1	Utarbeide forslag til politisk utvalgsstruktur (§)										
P 1.2	Utarbeide forslag til delegeringsreglement (§)										
P 1.3	Utarbeide forslag til politisk reglement (§)										
P 1.4	Utarbeide forslag til andre råd og utvalg (§)										
P 1.5	Utarbeide forslag til lokaldemokratiske ordninger (PP)										

### Delprosjekt Politisk utvalgsstruktur (P 1.1.-P 1.4)

#### Organisering, roller og arbeidsform

Fellesnemnda utgjør arbeidsgruppen. Det er opprettet et arbeidsutvalg av ordførere og tre representanter for fellesnemnda; Jonn Gunnar Lislelid, Tove Paule, Tor Tveter.

Fellesnemnda diskuterer saksutredninger fra administrasjonen og innstiller deretter til de tre kommunestyrene

## Mandat

Arbeidsgruppa skal utarbeide forslag til:

- Politisk utvalgsstruktur
- Delegeringsreglement
- Politisk reglement og øvrige reglement
- Andre råd og utvalg

## Delprosjekt Lokaldemokrati (P 1.5)

### Organisering, roller og arbeidsform

Fellesnemnda har nedsatt en arbeidsgruppe med 3 folkevalgte fra hvert kommunestyre og 1 fra fellesnemnda (1 fra hver kommune):

Merete Andrea Risan (leder), Elly Therese Thoresen, Andreas Muri, Jannike Thorsen, Andreas Brandt, Ulf Erik Knudsen, Lajla Hvaal, Øivind Hvidsten, Tor Orsteen, Ole Lønseth, Inge Høyen, Hjørdis Margrethe Trolsrud

- Kommunestyrene involveres gjennom workshop, temamøter, i arbeidsgrupper eller annet
- Fellesnemnda inviteres til å delta på befaringer/studieturer
- Innbyggere involveres i arbeidet
- Det lages samarbeidsarenaer med AP 3.1 (Stedsutvikling; flerkjernet senterstruktur)

## Mandat

Gjeldende lovverk og den politiske plattformen skal legges til grunn for arbeidet.

Før arbeidet starter opp skal arbeidsgruppa presentere hvordan innbyggere og andre vil involveres i prosessen.

1. Arbeidsgruppa skal utarbeide forslag til en Lokaldemokratistrategi, som skal inneholde:

- Verktøy for bruker- og innbyggermedvirkning
- Arenaer for bruker- og innbyggerinvolvering
- Rammer for samskaping
- Nærdemokratiordning som sikrer at kommunen kontinuerlig gir innbyggerne mulighet til å forme utviklingen i den nye kommunen

2. Arbeidsgruppa skal underveis, i 2018 og 2019:

- Samarbeide med arbeidsgruppen som arbeider med stedsutvikling (AP3)
- Følge utprøvingene av alternative lokaldemokratimodeller og bruke erfaringene inn i arbeidet med Lokaldemokratistrategien

Arbeidsgruppa rapporterer til fellesnemnda



## P2 Identitet, symboler og felles kultur

P 2	IDENTITET, SYMBOLER OG FELLES KULTUR	2017		2018				2019			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
P 2.1	Utarbeide forslag til nytt kommunevåpen (PP)						♦				
P 2.2	Utarbeide forslag til nytt ordførerkjede og andre symboler for den nye kommunen (PP)				♦						
P 2.3	Utarbeide grafisk profil for den nye kommunen				♦				♦		
P 2.4	Utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer for utvikling av felles kultur for innbyggere i den nye kommunen (PP)				♦		♦		♦		♦

### Organisering, roller og arbeidsform

Fellesnemnda har nedsatt en arbeidsgruppe med 3 folkevalgte fra hvert kommunestyre og 1 fra fellesnemnda (1 fra hver kommune):

Tor Tveter (leder), Lavrans Kierulf, Jonn Gunnar Lislelid, Ståle Sørensen, Victoria Øverland, Odd Gusrud, Lena Albrigtsen, Gard Hofsvang, Eili Bakketun, Jostein Birkeland, Runar Martin Dammen, Inge Hovland.

### Mandat P2.1-2.3

Gjeldende lovverk og den politiske plattformen skal legges til grunn for arbeidet.

1. Arbeidsgruppa skal utarbeide forslag til:

- Prinsipper for symboler og grafisk profil
- Nytt kommunevåpen
- Nytt ordførerkjede og andre symboler
- Grafisk profil for den nye kommunen

Arbeidet skal involvere og engasjere innbyggere, og gjennomføres i samråd med profesjonelle.

Før arbeidet starter opp skal arbeidsgruppa presentere hvordan innbyggere og andre vil involveres i prosessen. Prinsipper for symboler og grafisk profil skal fremmes for behandling i fellesnemnda, og vil danne grunnlaget for det videre arbeidet.

2. Arbeidsgruppa skal utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer for utvikling av felles kultur for innbyggere i den nye kommunen

Arbeidsgruppa rapporterer til fellesnemnda

**Mandat P2.4**

Prosjektet skal starte arbeidet med å bidra til å skape en felles kultur og identitet i Nye Drammen. Delprosjektet skal særlig vurdere følgende områder:

1. Bidra til å samordne større lokale arrangementer i 2019.
2. Kartlegge relevante aktører, arenaer og aktiviteter, og utarbeide en skisse til felles aktivitetsprogram som skal gjelde fra 2020.

Prosjektet deles inn i et forprosjekt gjennom 2018 – 2019 i regi av arbeidsgruppe for P2, med kartlegging og utarbeidelse av skisse til felles kulturplattform for Nye Drammen. Fra 2020 overtas arbeidet av organisasjonen Nye Drammen kommune og de nyetablerte politiske organene.

Arbeidsgruppa skal sammen med kommunenes representanter gjennomføre en relevant kartlegging av eksisterende kulturaktiviteter som grunnlag for videre arbeid med felles kultur.

**P3 Regional posisjon**

P 3	REGIONAL POSISJON	2017		2018				2019			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
3.1	Nye oppgaver fra stat og fylkeskommune										
3.2	Regionalt samarbeid										

**Organisering, roller og arbeidsform****Arbeidsform 3.2:**

Det opprettes en politisk arbeidsgruppe som inkluderer ordførerne, fordi kommunenes øverste tillitsvalgte representerer en nødvendig styrke for å representere og promotere Nye Drammen. Denne gruppen starter arbeidet med posisjonering umiddelbart. Dette innebærer blant annet å finne flere konkrete saker allerede i 2018 og 2019 for å synliggjøre ambisjonene til den nye kommunen. Arbeidsgruppen drøfter problemstillingene i diskusjonsmøter. Dersom det er naturlig, inviterer arbeidsgruppen samarbeidspartnere inn til seminar om fremtidens samarbeid eller besøker andre kommuner for å innhente erfaring.

Arbeidsgruppens sammensetning: Tore Opdal Hansen (H), leder, Bent Inge Bye, Andreas Muri, Eivind Knudsen, Arve Vannebo, Tove Paule, Trine Bingen, Kristin M. Surlien, Jonn Gunnar Lislelid, Gard Hofsvang, Syed Wali Haider Gilani, Turid Solberg Thomassen,

**Mandat 3.2:****Arbeidsoppgaver**

1. Prosjektet skal ta stilling til utbyttet av dagens ulike samarbeid. Det skal se på hvilke samarbeid vi har, hva er målene med samarbeidene og om målene er nådd. Er det naturlig å avslutte noen samarbeid?

2. Prosjektet skal se på nye samarbeidsformer i lys av målene til Nye Drammen. Hvilke nye samarbeidsformer ønsker vi, hva skal oppnås med de ulike samarbeidene og hva slags organisatorisk form skal de ha?
  - Eksempler: Viken, storbysamarbeidet til KS, samarbeidet mellom Drammen, Asker og Bærum («DAB»), Universitet i Sør-Øst Norge osv.

Innspillene samles i en strategi for *Regionalt samarbeid* som utarbeides av det nye kommunestyret. Strategien blir en del av en større helhet sammen med ny kommuneplan og ny næringsstrategi.

## Administrative prosjekter med behov for politisk forankring (AP)

- Administrative prosjekter med behov for politisk forankring igangsettes av administrasjonen, og er prosjektrådmannens ansvar
- Alle prosjektene vil innebære politisk involvering, i ulik grad og form
- Prosjektgrupper nedsettes av prosjektrådmann
- Prosjektrådmannen innstiller til fellesnemnda
- For alle AP-prosjekter vil det lages en oversikt som viser når ulike parter vil involveres og hva hensikten med involveringen skal være. Dette for å skape forutsigbarhet både for politikere, administrasjonen/ansatte og innbyggere/andre

(§) = lovpålagt

(PP) = Politisk plattform

◆ = Politisk vedtak

◆ = Politisk prinsippavklaring

### AP1 Forberedelse til arbeidet med ny kommuneplan

AP 1	FORBEREDELSE TIL ARBEIDET MED NY KOMMUNEPLAN	2018		2019				2020			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
AP 1.1	Utarbeide planstrategi (for avklaring før ny kommune) (PP)	◆			◆			◆	◆		
AP 1.2	Kommuneplanens samfunnsdel (forberedelser)						◆	◆			◆
AP 1.3	Kommuneplanens arealdel (forberedelser)										

Prosjektet omfatter forberedelser i tiden fram til etablering av ny kommune.

Framdrift i tiden etter etablering av ny kommune (på lysegrønn bakgrunn) er her kun illustrert som mulighet.

### Organisering, roller og arbeidsform

#### Mandat

## AP2 Strategier for tjenesteutvikling

AP 2	STRATEGIER FOR TJENESTEUTVIKLING	2017		2018				2019			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
AP 2.1	Utarbeide forslag til strategi for og utvikling av Utdanningspolitikk								♦		
AP 2.2	Utarbeide forslag til strategi for og utvikling av Oppvekstpolitikk								♦		
AP 2.3	Utarbeide forslag til strategi for og utvikling av Barnevernspolitikk								♦		
AP 2.4	Utarbeide forslag til strategi for og utvikling av Pleie- og omsorgspolitikk								♦		
AP 2.5	Utarbeide forslag til strategi for og utvikling av Helse- og sosialpolitikk								♦		
AP 2.6	Utarbeide forslag til og strategi for utvikling av Kultur-, idretts- og fritidspolitikk								♦		
AP 2.7	Utarbeide forslag til og strategi for utvikling av tekniske tjenester								♦		

### Organisering, roller og arbeidsform

#### Mandat

## AP3 Stedsutvikling

AP 3	STEDSUTVIKLING	2017		2018				2019			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
AP 3.1	Utarbeide strategi for flerkjernet senterstruktur (PP)								♦		
AP 3.2	Utarbeide forslag til lokalisering av tjenester										

## Organisering, roller og arbeidsform

Fellesnemnda har nedsatt en arbeidsgruppe med 3 folkevalgte fra hvert kommunestyre og 1 fra fellesnemnda (1 fra hver kommune):

Mads Hilden (leder), Øystein Lauritzen, Jostein Birkeland, Runar Berg, Torbjørn Faber Geirbo, Sølvi Brandt Bestvold, Kristin Haftorn Johansen, Johan Baumann, Tor Tvetter, Thor Sigurd Syvaldsen, Kristin Gjerde, Magnus Weggesrud.

- Innbyggere, lokalsamfunn og organisasjonsliv involveres i arbeidet
- Hovedtillitsvalgte og vernetjenesten involveres i oppgave AP 3.2
- For AP 3.1 Stedsutvikling, lages det samarbeidsarenaer med P 1.5 Lokaldemokrati

## Mandat

Prosjekt stedsutvikling er forankret i politisk plattform, og grunnlaget for arbeidet er senterstrukturen slik den er definert i politisk plattform del D – kommunespesifikke forhold.

Arbeidet i prosjektet gjennomføres i 2 faser.

Fase 1: Kartlegging, kunnskapsgrunnlag - fram til juni 2018

Arbeidet gjennomføres med fagstøtte fra samfunns-/byutviklingsmiljøene i de tre kommunene. Kartleggingen skal bl.a. omfatte:

- Befolkningstetthet og – struktur, kommunikasjon og transportstrømmer i hele den nye kommunen
- Relevante sosioøkonomiske forhold, levekår m.m. som er relevant for planlegging
- Områdeinndelinger, opptaksområder, distrikter o.l. på alle relevante tjenesteområder og funksjoner
- Sammenstilling av gjeldende kommuneplaner, synliggjøring av vedtatte utviklingsretninger Nye Drammen som geografisk og funksjonelt område

Fase 2: Strategi for stedsutvikling – fra juni 2018

A: Prosjektrådet legger fram sak om opplegget for kommuneplanarbeidet i fellesnemndas møte i juni. Saken vil omfatte det forberedende arbeidet for planstrategi og for kommuneplanens samfunns- og arealdel. Planstrategi, samfunnsdel og arealdel må behandles av kommunestyret i Nye Drammen, men forberedes i 2018/2019, slik at planstrategi kan vedtas tidlig i perioden som grunnlag for arbeidet med samfunns- og arealdelen.

B: Det skal utarbeides en strategi for stedsutvikling. Den skal bygge på kunnskapsgrunnlaget fra fase1 og skal bidra som grunnlag for beslutninger om lokalisering av tjenester, ref. AP3.2. Den skal også bidra som grunnlag for kommuneplanarbeidet.

C: Innbyggere, lokalsamfunn og organisasjonsliv involveres i arbeidet med strategien. Involveringen bør baseres på de verktøy og arenaer som beskrives i lokaldemokratistrategien.

D: Arbeidet med strategi for stedsutvikling er et administrativt prosjekt med behov for politisk forankring. Løpende politisk forankring skjer i arbeidsgruppen, mens fellesnemnda behandler saker ved større milepæler og når det skal gjøres prinsipielle veivalg som må forankres i kommunene.

## AP4 Arbeidsgiverpolitikk

AP 4	ARBEIDSGIVERPOLITIKK	2017		2018				2019				
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
AP 4.1	Utarbeide en omstillingsavtale for rekruttering og ivaretagelse av kompetanse og kapasitet											
AP 4.2	Utarbeide arbeidsgiverpolitisk plattform (PP)											
AP 4.3	Utarbeide etisk reglement for ansatte og politikere											
AP 4.4	Utarbeide lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår (PP)											

### Organisering, roller og arbeidsform

- Politisk forankring gjennom diskusjoner, prinsippvedtak og beslutning
  - Arbeidsgruppen for AP 4.4 Pensjon, består av Tove Paule, Merete A. Risan, Tor Tveter, Jonn Gunnar Lisleid, Elisabeth S. Arntsen, Lena Mandal, Gro Bolstad og Heidi Gravdahl Reek.
- Fellesnemnda vil ha et særlig ansvar for forankring i egne by-/kommunestyre.
- Hovedtillitsvalgte og vernetjenesten deltar i prosjektgruppe

### Mandat

## AP5 Interkommunale samarbeid og eierskap

AP 5	INTERKOMMUNALE SAMARBEID OG EIERSKAP	2018				2019			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
AP 5.1	Forberede og iverksette utredningsarbeid på særskilte områder (f.eks. pensjon, landbruk)								
AP 5.2	Utarbeide eierskapsmelding								
AP 5.3	Politisk behandling av selskapsporteføljen								

### Organisering, roller og arbeidsform

- Politisk forankring gjennom diskusjoner, prinsippvedtak og beslutning.
- Fellesnemnda vil ha et særlig ansvar for forankring i egne by-/kommunestyre
- Hovedtillitsvalgte og vernetjenesten deltar i prosjektgruppe

## Mandat

## AP6 Økonomisk politikk og handlingsregler

AP 6	ØKONOMISK POLITIKK OG HANDLINGSREGLER	2017		2018				2019			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
AP 6.1	Utarbeide årlig budsjett for sammenslåingsprosessen										
AP 6.2	Utarbeide forslag til handlingsregler										
AP 6.3	Utarbeide forslag til harmonisering av avgifter, gebyrer og brukerbetaling										
AP 6.4	Utarbeide forslag til økonomi- og handlingsprogram for 2020 i Nye Drammen										

## Organisering, roller og arbeidsform

- Politisk forankring gjennom diskusjoner, prinsippvedtak og beslutning.
- Fellesnemnda vil ha et særlig ansvar for forankring i egne by-/kommunestyre

## Mandat

## AP7 Innovasjon og digitalisering

AP 7	INNOVASJON OG DIGITALISERING	2017		2018				2019			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
AP 7.1	Utarbeide digitaliseringsstrategi										
AP 7.2	Utarbeide strategi for omstilling, innovasjon og endringsarbeid (PP)										

## Organisering, roller og arbeidsform

- AP 7.1 organiseres som Oppgaveutvalg. Oppgaveutvalget har vist seg vanskelig å gjennomføre. Prosjekt rådmannen kommer tilbake med en tilpasning av prosjektet.

*Å organisere som oppgaveutvalg for digitalisering vil innebære at 5 politikere samarbeider med 10 innbyggere/andre relevante aktører om å utvikle forslag til strategier/ambisjoner for digitalisering i ny kommune. De 10 innbyggerne/andre relevante søkes etter i hht kompetanseprofil gjennom et mandat som vedtas av fellesnemnda. Det kan søkes etter kompetanse som for eksempel ekspertise innenfor ulike områder knyttet til digitalisering eller innbyggere som er opptatt av økt digitalisering av kommunale tjenester/oppgaver.*



- De 5 politikerne som skal sitte i oppgaveutvalget er: Elly Therese Thoresen, Tonje Enersen, Dag Fjeld Edvardsen, Kristin Surlien, Trond Kjeldås.
- Kommunestyrene, administrasjonen, hovedtillitsvalgte, innbyggere og andre involveres gjennom workshop, temamøter, i arbeidsgrupper eller annet
- Fellesnemnda inviteres til å delta på befaringer/inspirasjonssamlinger/studieturer

## Mandat

### AP8 Kommunevalg 2019

AP 8	KOMMUNEVALG 2019	2017		2018				2019			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
AP 8.1	Gjennomføre kommunevalg										

### Organisering, roller og arbeidsform

Valgstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal bestå av 7 medlemmer og 7 varamedlemmer. Som faste medlemmer velges:

Andreas Muri (leder), Elly Th. Thoresen (nestleder), Silje Marie Breivik, Lavrans G. Ø. Kierulf, Vigdis Krohn Hansen, Inge Høyen og Tor Tveter

Som varamedlemmer velges for Drammen kommune 1. Tove Paule, 2. Eivind Knudsen, for Svelvik kommune 1. Kristin M. Surlien, 2. Mads Hilden, for Nedre Eiker kommune 1. Anne Sørensen, 2. Jostein Kretz.

Administrasjonen håndterer det formelle, jf. veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

## Mandat

## Administrative prosjekter (A)

- Administrative prosjekter i sin helhet tilhører prosjektrådmannens ansvarsområde. Fellesnemnda vil holdes orientert om framdriften i dem
- Strategier og områder som krever politisk avklaring vil bli fremmet for Fellesnemnda
- For alle A-prosjekter vil det lages en oversikt som viser når ulike parter vil involveres og hva hensikten med involveringen skal være. Dette for å skape forutsigbarhet både for ansatte, tillitsvalgsapparatet og politikere

(§) = lovpålagt

(PP) = Politisk plattform

◆ = Politisk vedtak

◆ = Politisk prinsippavklaring

### A1 Administrativ organisering, ledelse og tjenesteutvikling

A 1	ADMINISTRATIV ORGANISERING, LEDELSE OG TJENESTEUTVIKLING	2017		2018				2019			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A1.1	Organisering, styring og kontroll										
A 1.1.2	Utarbeide overordnet styringssystem				■	■	■	■			
A 1.1.3	Fastsette organisering og utvikling av sektor, tjenester og stab/støttefunksjoner				■	■	■	■	■	■	■
A 1.1.1	Ansette ledergruppe					■	■				
A 1.1.4	Utarbeide beredskapsplan							■	■	■	◆
A 1.1.5	Avklare internkontroll og kvalitetssystemer			■	■	■	■	■	■	■	■
A1.2	Virksomhetsoverdragelse										
A1.2.1	Kartlegge kompetansebehov, kompetanseutfordringer og kompetanse i de tre kommunene og den nye kommunen under ett (PP)			■	■	■	■	■	■	■	■
A1.3	HR										
A1.3.1	Gjennomføre tiltak for felles kulturbygging for ansatte			■	■	■	■	■	■	■	■

### Organisering, roller og arbeidsform

- Prosjektgrupper nedsettes av prosjektrådmannen
  - Prosjektleder er utpekt for A1.2 Virksomhetsoverdragelse og A1.3 HR
- Hovedtillitsvalgte og vernetjenesten deltar i prosjektgruppe

### Mandat

### A2 Eiendom

A 2	EIENDOM	2017		2018				2019				
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
A 2.1	Utarbeide forslag til strategi for eierskapsmodell av kommunale eiendommer											

### Organisering, roller og arbeidsform

- Prosjektet avklares nærmere når prosjektrådmann tiltrer
- Prosjektgruppe nedsettes av prosjektrådmannen
- Hovedtillitsvalgte og vernetjenesten deltar i prosjektgruppe

### Mandat

### A3 Kommunikasjon

A 3	KOMMUNIKASJON	2017		2018				2019				
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
A 3.1	Utarbeide kommunikasjonsstrategi for sammenslåingsprosessen											
A 3.2	Gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter											
A 3.3	Utarbeide kommunikasjonsstrategi for den nye kommunen											

### Organisering, roller og arbeidsform

- Prosjektet avklares nærmere når prosjektrådmann tiltrer
- Prosjektgruppe nedsettes av prosjektrådmannen
- Hovedtillitsvalgte og vernetjenesten deltar i prosjektgruppe

### Mandat

## A4 IKT, arkiv, matrikkel

A 4	IKT, ARKIV, MATRIKSEL	2017		2018				2019			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A 4.1	Avklare arkivdepot										
A 4.2	Avklare fagsystemer (IKT)										
A 4.3	Samordne matrikkel (Statens kartverk)										
A4.4	Nye adresser										

### Organisering, roller og arbeidsform

Det er opprettet en rådgivende samordningskomite for valg av veinavn:

1. Thor Sigurd Syvaldsen (AP), Nedre Eiker
2. Lena Albrigtsen (FRP), Nedre Eiker
3. Fredrik A. Haaning (H), Drammen
4. Lina Strandbråten (AP), Drammen
5. Else Høyer Nebel Tangen, Svelvik
6. Gunnar Helgerud, Svelvik

### Mandat

## A5 Anskaffelser

A 5	ANSKAFFELSER	2017		2018				2019			
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A 5.1	Samordne innkjøpsavtaler, forsikringer og vurdere behovet for nye avtaler										

### Organisering, roller og arbeidsform

- Prosjektet avklares nærmere når prosjektrådmann tiltrer
- Prosjektgruppe nedsettes av prosjektrådmannen
- Hovedtillitsvalgte og vernetjenesten deltar i prosjektgruppe

### Mandat
